

MSP - Ministerio de Salud Pública
Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud
Dirección Nacional de Discapacidades

PROYECTO: K006 MSP - ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV

Líder del Proyecto:	Jaramillo Sarmiento, Alvaro Antonio (alvaro.jaramillo@msp.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Restrepo, Laureano	Programas Relacionados:	ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV, Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe
Titular:	Perdomo García, Yorelvys	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	148,082,940.60
CUP:	123200000.0000.374560	TIR:	12.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	60,064,550.76
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	35,893,664.83
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2016
Fecha de última actualización:	05/10/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Robayo Robalino, Silvana Paulina	Fecha del siguiente Hito:	11/10/2016

DATOS GENERALES

Descripción

El Objetivo del Proyecto es.- Garantizar el acceso a la entrega de ayudas técnicas y la atención continua e integral a personas con algún tipo de discapacidad y grupos de atención prioritaria en riesgo de desarrollar discapacidad.

Beneficios Cualitativos

- Implementar acciones y servicios que permitan prevenir las discapacidades.
- Generar acciones necesarias que permitan el acceso de las personas con discapacidad a tratamientos de habilitación, rehabilitación e integración.
- Incrementar la detección precoz e intervención oportuna de las condiciones de salud potencialmente discapacitantes."

Tipo de Beneficiario

Población con discapacidad y la población en general, así como las personas con necesidades en cuidados paliativos y atención domiciliaria.


Restricciones

"Falta de personal especializado para la atención en servicios a los que prioriza el proyecto (rehabilitación, oftalmología, audiología, entre otros)
Recursos financieros insuficientes para el cumplimiento de objetivos debido al recorte del presupuesto que no cubre lo planificado"

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.05 %
Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

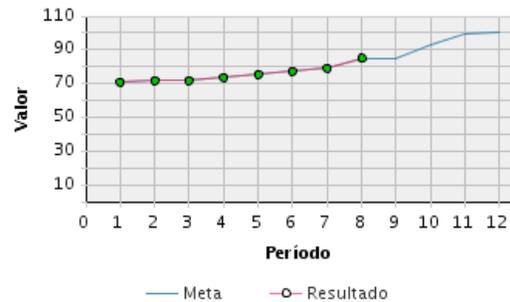

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	71 %	72 %	72 %	74 %	75 %	77 %	79 %	85 %	85 %	93 %	99 %	100 %
	Avance real acumulado											
	71 %	72 %	72 %	74 %	75 %	77 %	79 %	85 %				
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●				

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se solicitó el análisis respectivo del grupo de gasto 71, con la finalidad de realizar el retiro de recursos sobrantes de sueldos hasta el mes de Julio y liquidaciones correspondientes al personal que labora bajo el proyecto en territorio. - Se realizó el seguimiento correspondiente a los procesos a efectuarse el presente año, con el objeto de insistir sobre la aprobación de avales en el Ministerio de Finanzas, como también el inicio de ptoceos en cada una de las unidades para las cuales se transfirieron recursos. - Se ha recibido el primer borrador del manual de salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad , el mismo que se encuentra en revisión. - Se esta trabajando en la agenda de lanzamiento del muestrario de métodos anticonceptivos en sistema Braille. 	Robayo Robalino, Silvana Paulina	05/10/2016 - 03:54 PM
<p>AGOSTO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recopilación de procesos de información en forma física del 2013 al 2015. - Seguimiento de los procesos de adquisición en territorio. - Seguimiento de la implementación de catálogo electrónico en conjunto con el SERCOP. - Se ha realizado la recepción del Contrato N° 000007 de Emergencia con el Contratista Sr. Edwin Alberto Torres Miño Gerente General Importadora de Sistemas Médicos "INSISMED CIA. LTDA"; cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MODALIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA EL AUTOCUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES". 	Robayo Robalino, Silvana Paulina	04/10/2016 - 10:34 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Se ha solicitado a la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, el listado de los TAPS, que realizarían la entrega de ayudas técnicas, considerando las unidades calificadoras, con el objetivo de crear los usuarios en el Módulo de Despacho de Ayudas Técnicas. - Se ha remitido las directrices para la adquisición del material lúdico y didáctico para los Centros de Salud Tipo C Ciudad Victoria y Tipo B Santa Rosa, mediante memorandos Nro. MSP-PAIDRCS-2016-0555-M y MSP-PAIDRCS-2016-0552-M respectivamente. 		
<p>JULIO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la reforma correspondiente para cubrir el financiamiento de personal dentro de la Coordinación Zonal 9 y Distrito 17D08. - Se realizó la reforma correspondiente para distribuir los recursos a nivel nacional para la adquisición de ayudas técnicas y a 26 hospitales para la compra de equipamiento audiológico. - Revisión de procesos de contratación efectuados y recolección de archivos físicos de los mismos. - Seguimiento a la cancelación de procesos de arrastre, los mismos que en algunos casos se encuentran a la espera de aprobación de avales por parte del Ministerio de Finanzas. - Se realizó la socialización del contenido del proyecto final del Convenio entre el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y la Empresa Estatal Cubana NEURONIC, para el suministro de insumos y accesorios para el Programa de detección temprana y escolar de pérdidas auditivas, el cual fue enviado mediante memorando Nro. MSP-SNPSS-2016-2916 a la Coordinación General de Asesoría Jurídica para continuar con el proceso de suscripción. - Se ha realizado la creación de usuarios a los médicos calificadores en el Sistema de Prescripción de Ayudas Técnicas. - Levantamiento de información en unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención sobre tamizaje auditivo en el mes de julio. - Actualización del acuerdo ministerial de tamizaje auditivo. - Según la reunión mantenida el 13 de Junio, con Paige Stringer, Directora Ejecutiva de Global Foundation for Children with Hearing Loss; para coordinar la realización de un programa de formación profesional en el cribado auditivo neonatal, audiología pediátrica y terapia auditivo-verbal para niños de 0-6 años de edad, se procede con la elaboración del informe técnico de aprobación y jurídico para ser enviado a cooperación internacional para seguir el trámite de intercambio de conocimientos entre el personal del MSP y de la fundación. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>06/09/2016 - 10:05 AM</p>
<p>JUNIO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la capacitación en Cuidados Paliativos de 229 profesionales en la Zona 4, 7 y 6. - Informe de optimización del Talento Humano que labora contratado bajo el proyecto a nivel nacional. - Se emitió las directrices para la compra del material lúdico y didáctico para el Centro de Salud Tipo B de San Francisco de Onzole. - Se emitió las directrices al Distrito 13D10 Jama-Pedernales, para la para la compra de material lúdico para el Centro de Salud Tipo B de Cojimies. - Se solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica el proyecto de Convenio con la Empresa NEURONIC, con la Observaciones de la Dirección Nacional de Discapacidades y de la Empresa NEURONIC. - Se realizó la implementación de los servicios de rehabilitación: Terapia Física, Terapia ocupacional, estimulación temprana, terapia de lenguaje y psicorehabilitación del Centro de Salud Tipo B de Salasaca. - Se realizó la reforma que financiará el 2% del incremento del IVA de los procesos notificados. - Se implementó el Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas en todas los establecimientos de salud donde se realiza calificación de personas con discapacidad y en las 9 bodegas. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>02/08/2016 - 08:34 AM</p>
<p>Mayo 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Levantamiento de información en unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención sobre tamizaje auditivo. -Elaboración de criterios técnicos referente a equipamiento audiológico en los establecimientos de salud. -Elaboración de criterios técnicos referente a la adquisición de ayudas técnicas auditivas (Audífonos retro auriculares, implantes cocleares, BAHA y vibradores óseos) -Elaboración de un plan médico funcional para la captación, programación y realización de cirugías a pacientes con LF y PH en conjunto con la Dirección Nacional de Primer Nivel y la Dirección Nacional de Hospitales. -604 personas capacitadas en Cuidados al Cuidador/a a beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara. MSP - MIES -En el proceso de Implementación de Cuidados Paliativos se ha capacitado a 30 profesionales del Hospital de Calderón. -Reforma de partidas 71, para cubrir recursos de los sueldos hasta el mes de junio de 2016 de personal de la zona 8 y 9. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>27/06/2016 - 08:31 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> -Solicitud de cotizaciones a los proveedores de partes, piezas e insumos de los talleres de órtesis y prótesis con la finalidad de estandarizar los precios referenciales. -Revisión de TDRs para los procesos de compra de los talleres de órtesis y prótesis. -Ponderación de presupuesto para que se realice la reforma presupuestaria y posterior adquisición de andadores adulto sin ruedas, sillas de ruedas posturales para adulto e infantiles, colchones y cojines anti escaras. 		
<p>ABRIL 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la asignación presupuestaria en territorio para la adquisición de ayudas técnicas (Errores de refracción y audífonos). - Socialización del Plan Nacional de Cuidados Paliativos y de la Norma de Cuidados Paliativos a la Red Privada Complementaria. - Se realizó la asignación presupuestaria a los Distritos 05D01, 09D04, 19D04 y 18D02 para la adquisición del material lúdico y didáctico para las áreas de rehabilitación de estimulación temprana, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicorehabilitación de los Centros de Salud Tipo B y C. - Se realizó la movilización de ayudas técnicas existentes en bodegas de las diferentes zonas hacia Manabí y Esmeraldas para la entrega inmediata a los usuarios que lo requieren bajo prescripción médica, debido al terremoto. - Se envió el proyecto físico PAIDRCS requerido por la Dirección Nacional de Planificación, en espera de su revisión y análisis. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>08/06/2016 - 08:56 AM</p>
<p>MARZO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la asignación presupuestaria en territorio para la adquisición de ayudas técnicas (sillas de ruedas y pañales). - Se asignaron los recursos para solventar procesos de arrastre del 2015 notificados durante los meses de enero y febrero. - Ejecución del curso básico de Cuidados Paliativos a profesionales de la Red. (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) - Socialización del Plan Nacional de Cuidados Paliativos y de la Norma de Cuidados Paliativos a la Red Privada Complementaria. - Recepción de ayudas técnicas traspasadas desde SETEDIS. - Análisis para optimización de recursos en Talento Humano a nivel nacional. - Durante este periodo se solicitó mediante memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2016-0218-M, la adquisición de pañales tallas mediana y grande; además se ha dado seguimiento a las solicitudes de aval para que se inicien los procesos de compra de sillas de ruedas de 14,16 y 18 pulgadas. - Se realizaron modificaciones al presupuesto asignado destinado para insumos de los talleres de órtesis y prótesis, además de la revisión de las especificaciones técnicas de las partes y piezas para dar inicio a los procesos de adquisición. - Se está realizando el levantamiento y priorización de instituciones educativas a intervenir por medio del programa de errores de refracción. - Se gestionó con el SERCOP la inclusión de las ayudas técnicas dentro del catálogo electrónico. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>29/04/2016 - 05:25 PM</p>
<p>FEBRERO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la asignación presupuestaria para financiar el talento humano contratado bajo el Proyecto, tomando en consideración el techo presupuestario considerado para este fin dentro de la planificación del presente año, con lo cual se financió al personal en territorio para cinco meses (Hito 55). - Capacitación en Curso Básico de Cuidados Paliativos, realizado en la Zona 8, 112 profesionales de la Sociedad Civil, Clínicas Privadas, Junta de Beneficiencia (Hospital Luis Vernaza) y SOLCA Guayaquil; en la Zona 5, 200 profesionales las provincias de Santa Elena, Guayas Rural, Galápagos, Los Ríos y Bolívar y 75 personas en la Zona 9. - Se realizó la asignación presupuestaria a los Distritos (07D03, 07D02, 013D03, 05D01, 05D02, 09D07, 17D03, 18D01, 18D02, 18D04, 18D06) para la adquisición de material lúdico y didáctico para el equipamiento de las áreas estimulación temprana, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicorehabilitación. - Se remitió a los Distritos el listado de material lúdico y didáctico, especificaciones técnicas, y aspectos mínimos a considerar para la elaboración de los términos de referencia definitivos para la compra de material lúdico y didáctico. - Se han capacitado 321 personas en Cuidados al Cuidador, en conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica, en las provincias de Esmeraldas, Orellana, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro y Pichincha. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>05/04/2016 - 08:30 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se solicita a la Dirección de comunicación, realizar el diseño de portada y contraportada del Muestrario de métodos anticonceptivo para posterior imprimir 400 ejemplares en sistema Braille. - Se ha realizado avances en la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad. - Levantamiento de actividades del personal de la Dirección Nacional de Discapacidades y Proyecto, con la finalidad de supervisar, reestructurar funciones y determinar un nivel óptimo. - Constatación y traspaso de camas hospitalarias del Hospital Enrique Garces a las bodegas del Ministerio de Salud Pública para su mantenimiento y distribución. - Levantamiento de procesos de contratación realizados en el marco del proyecto durante los años 2013, 2014 y 2015. - Revisión del manual con CNT, referente al sistema de comunicación con los usuarios. - Organización de capacitación en territorio a cuidadores de personas con discapacidad referente al bono de Desarrollo Humano y Joaquín Gallegos Lara. - Se realizó la capacitación a 195 profesionales de los Equipos de Atención Integral en Cuidados Paliativos de la zona 1 y 2 (125 y 70 respectivamente). 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>04/03/2016 - 02:12 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se coordinó los eventos a nivel nacional por el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, específicamente el realizado en la ciudad de Guayaquil, realizado en conjunto con Ministerios de Educación, Inclusión Social, SETEDIS y CONADIS. * Se coordinó la implementación del área de estimulación temprana en el Hospital de Maternidad Nueva Aurora del Sur de Quito. * Se realizó brigadas médicas de calificación y entrega de ayudas técnicas en áreas de difícil acceso, tales como: Taisha, Paquisha y Galápagos, entre otras que por la accesibilidad no se tiene equipos de calificación. * Se efectuó seguimiento con la Zona 8 para revisar el traslado del Taller de órtesis y prótesis en Guayaquil ubicado en el Hospital Abel Gilbert Pontón, así como se revisaron actas, planos y presupuesto para gestionar el traslado. * Coordinación con la Dirección Nacional de Equipamiento para elaborar fichas técnicas de ayudas técnicas como sillas de ruedas y audífonos para el catálogo electrónico. * Coordinación con la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud y Normatización para la elaboración de la Guía de Servicio de Audiología y Rehabilitación Auditiva. * Adecuación y contratación de talento humano para el Taller de Órtesis y Prótesis de Quito, además de habilitación y puesta en marcha del Centro Mecanizado. * Instalación de sistema de extracción de olores para el Taller de Órtesis y Prótesis de Quito. * Coordinación para renovar nueva Nota Reversal o Convenio con el MIDENA para apoyo logístico y mantenimiento de vehículos como servicio institucional. * Coordinación con Economía de la Salud y la Gerente Institucional para la Eficiencia de la Red Pública Integral de Salud y la Red Privada Complementaria para la inclusión del tarifario de cirugías oftalmológicas y servicios de órtesis y prótesis. * Coordinación con el personal técnico en territorio para la elaboración del plan de mantenimiento de equipos a nivel nacional. * Liquidación del convenio de mantenimiento de equipos audiológicos con la empresa cubana Neuronic, con el respectivo pago. * Validación a nivel nacional del personal para planificación 2016, con la confirmación de solicitud para ingreso a gasto corriente de profesionales de la salud. * Seguimiento de procesos de contratación para adquisición de ayudas técnicas a nivel nacional y entrega de las mismas. 	<p>Jaramillo Sarmiento, Alvaro Antonio</p>	<p>12/01/2016 - 08:05 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se coordinó el curso básico de cuidados paliativos para profesionales de primer, segundo y tercer nivel de las ciudades de Quito, Guayaquil y Riobamba. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>28/12/2015 - 11:33 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> * Se realizó la inauguración del Centro de Salud Tipo B de Totoras, el cual cuenta con terapia física, terapia ocupacional, Terapia de lenguaje, estimulación temprana y psicorehabilitación. * Se esta realizando la Consolidación de los informes de ejecución presupuestaria del presupuesto asignado a los diferentes hospitales para la compra de material de osteosíntesis y endoprotesis y los beneficiarios. * Se esta realizando el seguimiento de la redistribución de material didáctico y lúdico para los Centros de Salud Tipo B de Paquisha y Achupallas. * Se solicitó a la Coordinación General de Planificación y Administrativa Financiera las gestiones para realizar el pago de los anticipos de los procesos, que se encontraban pendientes de cancelación. * Se solicitó la conformación de la comisión técnica para la firma del acta entrega recepción del convenio con Neuronic, de esta manera proceder a la cancelación del mismo. * Redistribución de recursos no utilizados en territorio, para la adquisición de sillas de ruedas por el monto de USD \$ 194.370,08 en determinados distritos a nivel nacional y para implantes cocleares por USD \$31.554,00 al Hospital Pediátrico Baca Ortiz. * Ejecución de la Brigada de Salud para la Rehabilitación basada en la Comunidad (RBC) en la Isla Puná y Paquisha con equipos de calificación de las zonas y apoyo logístico del MIDENA. * Se realizó el borrador de la Guía de Bolsillo para instruir en el manejo de la prescripción de ayudas técnicas dirigido a médicos calificadores. * Se realizó el borrador del Proyecto de Mantenimiento preventivo y correctivo de ayudas técnicas. * Distribución de bienes, cartillas de Snollen, material lúdico y didáctico de los servicios de rehabilitación del Ministerio de Salud Pública en los tres niveles de atención. * Puesta para test del aplicativo de prescripción, bodegaje y entrega de ayudas técnicas, para lo cual se realizó el respectivo análisis. 		
<p>OCTUBRE 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se revisó con la Dirección Nacional de Planificación e Inversión, el recorte presupuestario por parte del Ministerio de Finanzas referente a Sueldos (Grupo 71) y se coordinó las reasignaciones para solventar el desfinanciamiento de remuneraciones en varias zonas a nivel nacional. * Se inauguró los Centros de Salud Tipo B de Paquisha y Molleturo con los servicios de rehabilitación, para lo cual se dió apoyo en el financiamiento, compra e instalación de material lúdico y didáctico en las áreas de terapia de lenguaje, ocupacional y estimulación temprana. * Reasignación de material lúdico y didáctico de los Centros de Salcedo, Patate, Río Verde, Joya de los Sachas, Saquisilí, Catamayo, Molleturo, hacia los nuevos centros de Paquisha y Achupallas. * Reasignación de presupuesto para la adquisición de sillas de ruedas en 13 unidades operativas. * Se coordinó con la Dirección Nacional Administrativa la recepción de equipos tiflotecnológicos desde SETEDIS en referencia al Convenio suscrito. * * Termino de intervención de salud y vinculación de Establecimientos de salud del MSP en Centros Gerontológicos de atención Directa del MIES dirigidos a personas con discapacidad (Modalidad residencial, diurna, espacios alternativos y cuidado domiciliario.) 10 Centros Gerontológico del MIES a Nivel Nacional. * Continuación de capacitación a Cuidadores de personas beneficiarias del Bono Joaquín Gallegos Lara. Trabajo conjunto MSP -MIES, corte hasta el 30 de octubre de 2015 15000 cuidadores capacitados. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>14/12/2015 - 04:50 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> * Socialización y observaciones de la dirección de Primer Nivel del MSP al documento de remisión de pacientes con discapacidad. MIES - MINEDUC - MSP. * Se llevó a cabo el Segundo Congreso de Cuidados Paliativos del 19 al 22 de Octubre de 2015. * Coordinación para la transferencia de sillón odontológico que se encontraba con dispensación de nivel central para que sea ubicado en el CRIE de Conocoto. * Se realizó el Primer Curso Básico de Cuidados Paliativos dirigido a médicos, psicólogos y enfermeras de la Unidades tipo C, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Cuencallos días 29 y 30 de Octubre. * Se traspasó desde el Centro de Rehabilitación Integral de Conocoto al Hospital General Vicente Corral Moscoso, implantes osteointegrados destinados para 13 pacientes con deficiencia auditiva. 		
<p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se realizó la PAPP 2016 del proyecto, tomando en consideración el presupuesto destinado dentro de la Proforma para este año. * Se realiza la adjudicación de los procesos iniciados con la finalidad de adquirir ayudas técnicas (andadores, audífonos, sillas de ruedas posturales). * Se realizaron las modificaciones pertinentes al documento del proyecto para obtención de la prioridad SENPLADES. * Se ha realizado el equipamiento del Centro de Salud Tipo B de Molleturo de la provincia de Azuay. * Se ha avanzado en conjunto con la Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa en la elaboración de los vinilos de los servicios de rehabilitación, los cuales se encuentran en fase de modificación de las observaciones realizadas por la DNPNAS Y DND, previa su validación. * Se realizó la impresión de las Guías de Cuidados Paliativos conjuntamente con 5.000 ejemplares del formulario correspondiente. * Planificación del Curso Básico de Cuidados Paliativos a realizarse en la Coordinaciones Zonales 3,6,8 y 9 hasta el 4 de Diciembre de 2015. * Capacitación a Cuidadores de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara .- Trabajo conjunto MSP -MIES, corte hasta el 30 de septiembre de 2015 13.888 cuidadores capacitados. * Dos eventos demostrativos de la intervención del MSP en Centros Gerontológicos de atención Directa del MIES dirigidos a personas con discapacidad (Modalidad residencial, diurna, espacios alternativos y cuidado domiciliario), centro Gerontológico de Pedernales y Centro Gerontológico de Milagro. * Culminación de réplica de capacitación Taller "Cuidados al Cuidador" a prestadores de servicios de Centros Gerontológicos de Atención Directa del MIES en coordinación con MSP. 350 Técnicos capacitados al 30 de septiembre de 2015. * Corrección del Primer borrador de remisión de paciente MIES - MSP- MNEDUC. * Transferencia presupuestaria al Hospital Vicente Corral Moscoso, con la finalidad de adquirir un micromotor y monitor de nervio facial para poder ejecutar cirugías de implantes cocleares, de igual manera para accesorios para los mismos, para los hospitales Francisco Icaza Bustamante, Abel Gilbert Pontón y Pediátrico Baca Ortiz. * 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>10/11/2015 - 04:11 PM</p>
<p>AGOSTO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Capacitación a Cuidadores de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara .- Trabajo conjunto MSP -MIES, corte hasta el 31 de agosto de 2015. Se ha capacitado a 10.746 cuidadores a nivel nacional. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>12/10/2015 - 02:02 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> * Dos eventos demostrativo de la intervención del MSP en Centros Gerontológicos de atención Directa del MIES dirigidos a personas con discapacidad (Modalidad residencial, diurna, espacios alternativos y cuidado domiciliario). * Inclusión de representante de MINEDUC en comisiones permanentes de trabajo de la Matriz Intersectorial de actividades planificadas para la ejecución de la política pública de discapacidades. * Ejecución de réplica de capacitación Taller "Cuidados al Cuidador" a prestadores de servicios de Centros Gerontológicos de Atención Directa del MIES en coordinación con MSP: 350 técnicos capacitados al 31 de agosto de 2015. * Seguimiento a procesos paralizados por falta de aprobación de avales desde el Ministerio de Finanzas. * Se realizaron las observaciones obtenidas durante el servicio de mantenimiento de los equipos marca Neuronic. * Se inauguro en la Provincia de Esmeraldas el Centro de Salud Tipo C de Rio Verde y en la provincia de Cotopaxi se inauguraron tres Centros de Salud; 2 tipo B de Zumbahua y Salcedo y un Tipo C de Saquisilí, los cuales cuentan con los servicios de Terapia Física, terapia ocupacional, estimulación temprana, terapia de lenguaje y psicorehabilitación * Asignación presupuestaria realizada en territorio para la adquisición de audífonos, implantes cocleares y accesorios. 		
<p>JULIO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se concluyó el borrador del informe técnico final del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador y la Empresa Estatal Cubana Neuronic, para el servicio de mantenimiento técnico de los equipos del Programa de detección temprana y escolar de pérdidas auditivas, con la finalidad de dar terminación al convenio mantenido durante el año 2014 - 2015. * Ejecución de capacitación a técnicos prestadores de servicios de los Centros de atención Directa de la Dirección de Prestación de Servicios del MIES a nivel nacional. - 65 técnicos capacitados. * Atención Médica Integral en Salud a Monasterio de Hermanas Descalzas del Ecuador.- 12 Centros a Nivel nacional. * Avance en la Capacitación Cuidados a Cuidadores/as de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara .- Trabajo conjunto MIES - MSP, corte hasta el 30 de julio de 2015. Se ha capacitado a 2.720 cuidadores/as a nivel nacional. * Se ha equipado los Centros de Rehabilitación Integral Especializados número 3 y 4, de Ibarra y Portoviejo con material didáctico y lúdico para los diferentes servicios de rehabilitación como estimulación temprana, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicorehabilitación. * Se remitió a la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención, los lineamientos y directrices para la realización del proceso de compra de material didáctico, lúdico y biomédico requirentes para los diferentes servicios de rehabilitación, validados por la DND. * Se ha avanzado en conjunto con la Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa en la elaboración de los vinilos de los servicios de terapia física y terapia ocupacional. * Consolidación de los listados de personas con discapacidad muy grave y severa por provincias como referencia al grupo que será intervenido en Cuidados Paliativos. * Selección de las Unidades Operativas de Primer, Segundo y Tercer Nivel de las provincias y zonas que van a ser intervenidas (Zonas 6, 8 y 9) en la primera fase de la implementación de Cuidados Paliativos. * Socialización de modelo de gestión de servicios de salud en contextos penitenciarios.- Componente Paliativos y Primer Nivel MSP. * Consolidación de la matriz MCDS, trabajo intersectorial MIES -MSP- para planteamiento de hoja de ruta. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>10/09/2015 - 10:29 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> * Revisión bibliográfica de Baremos que ya han sido probados en otros países de forma adecuada (conformación comisión técnica) para la fundamentación y adaptación del Baremo de Dependencia. * Fortalecimiento del Talento Humano correspondiente al Taller de Conocoto. * Cancelación del contrato de adquisición de partes y piezas destinados para el Taller de órtesis y prótesis mantenido por medio del Hospital Eugenio Espejo. * Recepción y distribución de los pañales para adulto adquiridos por medio del Hospital del Adulto Mayor a Nivel Nacional. 		
<p>JUNIO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se está realizando el cierre de convenio Neuronic se finiquita las actas de mantenimientos que están pendientes, para realizar el informe de finalización, el convenio finaliza el 07/07/2015. * Ejecución de capacitación a técnicos de los Centros de la Dirección de la Población Adulta Mayor MIES y profesionales de los distritos de las zonas 4 y 7 del MSP.- ciudad de Quito.- 160 técnicos y profesionales capacitados. * Ejecución del Taller Demostrativo "Cuidados al Cuidador" de los Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos.- MIES - MSP. (Ejecución 8 de junio).Mas de 400 asistentes al evento. * Organización de capacitación a Técnicos de los Centros Diurnos de la Dirección de la Prestación de Servicios del MIES a ejecutarse el 02 y 03 de julio de 2015. * Planificación y ejecución de acciones para brindar atención integral a la petición del Monasterio Carmelitas Descalzas del Ecuador a 13 centros a nivel nacional. * Se inauguro en la Provincia de Tungurahua el Centro de Salud Tipo B de Patate, mismo que cuenta con los servicios de Terapia Física, terapia ocupacional, estimulación temprana, terapia de lenguaje y psicorehabilitación. * Se esta trabajando con la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, en un instructivo para los distritos sobre los lineamientos y directrices para la realización del proceso de compra de material didáctico, lúdico y biomédico requirentes para los diferentes servicios de rehabilitación. Además se esta realizando un Manual de Equipamiento para los Centros de Salud Tipo A, B y C por parte del PFRSSMC en coordinación con la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención y la Dirección Nacional de Discapacidades. * La mayor cantidad de Centros de Salud cuentan con el material didáctico y lúdico para el equipamiento de las áreas de rehabilitación, sin embargo debido a que los Distritos no cuentan con las actas de ocupación de las obras, no se puede realizar el equipamiento de las mismas. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>05/08/2015 - 02:54 PM</p>
<p>MAYO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se solicitó a las Coordinaciones Zonales información sobre los deficiencias y necesidades logísticas que tienen, de tal forma que se obtuvo los requerimientos y planificación para las compras de equipamiento. * Se ha realizado la inauguración de Salud Tipo C como: Joya de los Sachas y Guamaní en las provincia de Orellana y Pichincha respectivamente, los cuales cuentan con terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicorehabilitación y estimulación. De igual forma, se equipó los servicios de rehabilitación del Centro de Salud Tipo C de Catamayo y Nabón, mismos que se encuentran aperturados. * Se realizó la redistribución de ayudas técnicas para garantizar un stock mínimo, hasta que se concreten las adquisiciones solicitadas a todas las Coordinaciones Zonales. * Se coordinó con la Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario la aprobación y realización de fichas de ayudas técnicas (sillas de ruedas de 16,14 y 18 ", sillas de baño y evacuar, andadores, ventilador de presión positiva y colchones antiescaras) para la realización de los procesos de compra de los mismos. * Análisis del Servicio Técnico prestado por la empresa NEURONIC como parte del Convenio de mantenimiento de equipos mantenido con ellos, para realizar la finalización del mismo. 	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>11/07/2015 - 10:11 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* Se realizó y validó informe para cierre de proyectos en SENPLADES por parte de SETEDIS, en vista que el Proyecto actual ya contempla y ejecutar dichos proyectos.</p> <p>* Se realizó capacitaciones de "Cuidados al Cuidador" dentro del programa de cuidados paliativos, dirigidos a técnicos y prestadores de Adulto Mayor; y de ayudas técnicas, calificación y cuidados al Balcón de Servicios del MIES.</p>		
<p>ABRIL 2015:</p> <p>* Se asignan recursos para la adquisición de audífonos para pérdidas leves-moderadas, Severas y Profundas por USD 1.500.000.</p> <p>* Se ha solicitado a la Dirección Nacional de Equipamiento normar y aprobar todas las fichas técnicas para poder solicitar el inicio de los procesos de compra que ya cuentan con recursos asignados a las Coordinaciones Zonales.</p> <p>* Mediante Memorando Nro. MSP-VAIS-2015-0425-M de fecha 15 de abril la Viceministra de Atención Integral en Salud, solicita al Coordinador General Administrativo Financiero se realice el control previo y se continúe con el trámite de liquidación del convenio de pago 0055.</p> <p>* Mediante Memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2015-0050-M de fecha 30 de abril de 2015 se justifica el Plan Visión y Compra de lentes (Errores de Refracción); así se solicitó se realicen las reformas presupuestarias por USD 1.468.216,27 y 1.986.021,70, respectivamente.</p> <p>* Mediante memorando Nro. MSP-DND-2015-0484-M, de fecha 30 de abril de 2015 en el cual se solicita la EJECUCIÓN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS PACIENTES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, llegando el valor de la transferencia al monto de USD 97.529,82.</p> <p>* Se asignan recursos al Ministerio de Defensa Nacional, según Nota reversal para el apoyo logístico de entrega de ayudas técnicas por USD 1.500.000.</p> <p>* Elaboración de los TDR para la contratación de una imprenta que se encargue de la impresión de 4000 Normas de Cuidados Paliativos y los TDR para la contratación entidad educativa que realice formación en cuidados paliativos, presencial y on line.</p>	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>19/05/2015 - 10:02 AM</p>
<p>MARZO 2015:</p> <p>* Se realiza la asignación e informa a las Coordinaciones Zonales 1,3 y 5 para adquisición de ayudas técnicas para distribución nacional, por un valor de USD 1.349.729,59.</p> <p>* Mediante memorandos Nro. MSP-DND-2015-0265-M y MSP-DND-2015-0265-M, se informa que se ha realizado la asignación de recursos para la compra de material de osteosíntesis y endoprotesis de las Unidades Operativas: Hospital Liborio Panchana Sotomayor, Hospital Martín Icaza de Babahoyo, Coordinación Zonal N° 3 y Hospital Vicente Corral Moscoso; por un valor de USD 2.989.703,92.</p> <p>* Se realiza Borrador de la Guía de Prevención y Cuidado de Úlceras por Presión para Personas Cuidadoras y Borrador del Afiche de Medidas de Prevención de Úlceras por Presión.</p> <p>* Elaboración de metodología para capacitación a capacitadores técnicos bono Joaquín Gallegos Lara (MIES) - profesionales MASP sobre cuidados al cuidador.</p>	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>19/05/2015 - 09:31 AM</p>
<p>FEBRERO 2015:</p> <p>* Se asignan recursos para la adquisición de sillas de evacuar, pañales, colchones y cojines anti-escaras; se brinda apoyo técnico para iniciar los procesos de compra y de esta manera evitar desabastecimiento.</p> <p>* Se asignaron valores para materiales e insumos para los tres talleres de órtesis y prótesis, equipamiento y mantenimiento de los tres talleres e Infraestructura del taller Guayaquil por un valor de 1.329.800.</p> <p>* El 05 de febrero de 2015 Mediante Memorando Nro. MSP-DND-2015-0117-M de fecha, se informa a otros distritos que han sido priorizados, que se ha realizado la asignación de recursos USD 36.771,14 para la compra de material didáctico y lúdico con la finalidad de que se realice la gestión pertinente para la compra de los mismos.</p>	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>19/05/2015 - 09:29 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* Mediante Memorando Nro. MSP-DND-2015-0097-M de fecha 02 de febrero de 2015 se da a conocer a las Coordinaciones Zonales el Convenio entre el MSP y la empresa Neuronic, y el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos audiológicos segunda etapa.</p>		
<p>ENERO 2015:</p> <p>* Se realizaron varios formatos de matrices para recolección de información en territorio para alimentar el indicador; paralelamente se ha realizado el autolevantamiento de procesos para iniciar con la automatización del proceso.</p> <p>* Se asignaron recursos para sueldos de personal de Talleres de órtesis y prótesis, personal brigadista, guardalmacén, médicos y psicólogos calificadoros, terapistas y fonoaudiólogos a nivel nacional.</p> <p>* El 27 de enero de 2015 mediante Oficio Nro. MSP-DND-2015-0040-O se informa a los diferentes distritos en los cuales se van a inaugurar Centros de Salud Tipo B y C, que se ha realizado la asignación de recursos USD 36.771,14 para la compra de material didáctico y lúdico y mediante memorando Nro. MSP-DND-2015-0079-M de fecha 28 de enero de 2015, se envía los términos de referencia, especificaciones técnicas de material didáctico y lúdico recursos.</p> <p>* El 26 de enero de 2015 mediante Memorando Nro. MSP-DND-2015-0071-M, se informa al Hospital Pablo Arturo Suarez que se ha realizado la asignación de USD 408,955.89 destinado a compra de endoprótesis y osteosíntesis. Se realiza el Borrador de la Adopción de la Guía de Atención Domiciliaria y el Borrador de la Norma de Atención Domiciliaria.</p>	<p>Robayo Robalino, Silvana Paulina</p>	<p>19/05/2015 - 09:27 AM</p>
<p>Diciembre 2014:</p> <p>* Mediante Memorando Nro. MSP-DND-2014-0528-M del 24 de diciembre de 2014, la Dirección Nacional de Discapacidades da a conocer el informe del plan piloto del Denver II y del Modelo de Gestión modificado a la Dirección de Estadística para su revisión y validación.</p> <p>* El componente de ayudas técnicas completó las capacitaciones del Instructivo Administrativo de Ayudas Técnicas; se realizaron visitas a las bodegas; se ha capacitado a personal CNT para mejorar el servicio en contact center 171.</p> <p>* Se realizó taller de capacitación presencial a ocho (8) equipos de calificación del IESS. El evento tuvo una duración de cinco(5) días, cada equipo estuvo conformado por : médico/a Psicóloga/o Trabajador/a Social</p> <p>* Elaboración de tablas estadísticas sobre las personas con discapacidad, con variables como: tipo, grado, porcentaje, sexo, provincia y cantón; para consumo de instituciones y ciudadanos que las solicitan.</p>	<p>Panchi Jima, Juan Carlos</p>	<p>06/05/2015 - 02:30 PM</p>
<p>Noviembre 2014</p> <p>* Mediante Oficio Nro. MSP-DND-2014-0177-O, se solicitó al Hosp. Génico Obstétrico Maternidad Isidro Ayora, remitir a la DND el Reporte de Avance Técnico y Financiero de las actividades realizadas por la Fundación San Juan de Jerusalén con el fin de canalizar la transferencia de recursos al Hospital para el año 2015 y continuar con la compra de servicios para la población (0-5 años) con factores de riesgo de trastornos de neurodesarrollo.</p> <p>* Mediante memorando Nro. MSP-DND-2014-0358-M se confirma la capacitación del personal Técnico de Mantenimiento y Fonoaudiólogos dando cumplimiento a lo que establece el Convenio Servicio de Mantenimiento a los equipos audiológicos.</p> <p>* Se realizó la coordinación de la feria por el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad en Guayaquil; la transferencia, traslado y distribución de las ayudas técnicas a las Coordinaciones Zonales para la dotación a las personas con discapacidad y la capacitación en territorio del instructivo Administrativo de Ayudas técnicas.</p>	<p>Panchi Jima, Juan Carlos</p>	<p>06/05/2015 - 02:29 PM</p>
<p>JULIO 2014</p> <p>*Plan de contingencia en el CRIE de Guayaquil por daños en el sistema eléctrico e infraestructura general, el proceso de consolidación del proyecto de potencialización está siendo ejecutado por</p>	<p>Calderón Villota, César Augusto</p>	<p>12/08/2014 - 01:16 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>provisión de servicios de la coordinación zonal #8 para evitar los problemas eléctricos del aire de Terapia Física y climatización.</p> <p>*El Proceso de Calificación de Personas con Discapacidad realizó capacitaciones a personal de CNT-Agendamiento por contact center 171, desde el 15 de agosto de 2014 se priorizaron 130 Unidades Operativas Calificadoras para agendamiento exclusivo para calificación los días viernes de 8am a 3pm, atendiendo 8 pacientes por día, esto sin que se vea afectada la demanda espontánea, al 30 de septiembre se completarán 222 unidades calificadoras para agendamiento por 171 de esta manera evitamos que personas con discapacidad tengan que solicitar turnos por demanda espontánea.</p> <p>*Mediante memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2014-0565-M se da a conocer el Convenio entre el MSP y Neuronic para conocimiento de las obligaciones del MSP y se adjunta el cronograma de mantenimiento. Mediante memo MSP-PAIDRCS-2014-0597-M, se solicita a la Coordinación Administrativa Financiera se proceda con el primer pago del Convenio Servicio Técnico de Mantenimiento a los equipos audiológicos.</p> <p>*Se ejecutó el "TALLER TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE LA DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS MOTRICES DEL NEURODESARROLLO". los días 22, 23,24 y 25 de julio del 2014, con pediatras y neonatólogos. Se ha enviado a la Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud el criterio técnico sobre la adopción y aplicación del test de DENVER II en el país.</p> <p>JUNIO 2014 Neurodesarrollo</p> <p>Se recibió respuesta favorable de la Dirección de Normatización de Talento Humano, acerca del plan de capacitación del "TALLER TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE LA DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS MOTRICES DEL NEURODESARROLLO".</p> <p>Se llevó a cabo el taller de capacitación a pediatras y neonatólogos los días 10,12 y 13 de junio, a los profesionales de las siguientes Zonas 1,6 y 9.</p> <p>Se realiza el envío de Insumos Técnicos a la Dirección Nacional de Hospitales</p> <p>Auditivo</p> <p>Se firma el "CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA EMPRESA NEURONIC PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS AUDIOLÓGICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA".</p> <p>Visual</p> <p>Mediante memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2014-0499-M, se solicita REFORMAS PRESUPUESTARIA GRUPO 73 VARIAS PROGRAMA 50 PROYECTO 100, con la finalidad de poder cubrir la demanda de usuarios en el Programa Errores de Refracción.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MSP-CZ9-2014-3052 y Memorando Nro. MSP-CZ9-2014-3183, la Coordinación Zonal 9 invita al evento "Entrega de Lentes para Escolares" actividad organizada por el Distrito 17D07 Parroquias Urbanas:(Chillogallo a la Ecuatoriana) - SALUD a través del Programa de Errores de Refracción</p>		
<p>DICIEMBRE</p> <p>INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO - El 11 de noviembre del 2013 se realiza el pago al Convenio de Servicio de Mantenimiento Técnico 2013 entre la empresa Neuronic y el MSP Dentro de programa se realiza "Taller de Capacitación a Técnicos a escala nacional para realizar mantenimiento a los equipos audiológicos basado en la Tecnología Neuronic", con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio de Servicio de Mantenimiento Técnico 2013 entre la empresa Neuronic y el MSP, con sede en Guayaquil.</p> <p>INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS - Hasta la actualidad cada centro presenta su señalética correspondiente, adecuaciones de infraestructura interna como externa, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento correctivos del equipo.</p>	Calderón Villota, César Augusto	09/01/2014 - 10:12 AM
<p>NOVIEMBRE</p> <p>INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO - El 11 de noviembre del 2013 se realiza el pago al Convenio de Servicio de Mantenimiento Técnico 2013 entre la empresa Neuronic y el MSP.</p> <p>INDICADOR 2.- TAMIZAJE VISUAL - Mediante memorando Nro. MSP-DNDRCES-2013-2159-M, se vuelve a socializar a las provincias los instructivos para la ejecución de los programas: Plan Visión y Errores de refracción.</p> <p>INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS - Se considera que la potencialización del equipo se lo realizará el año 2014 con el Criterio Técnico del Proyecto de Equipamiento.</p>	Calderón Villota, César Augusto	09/01/2014 - 10:10 AM
<p>OCTUBRE</p> <p>INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO - El 29 de octubre se realiza el ingreso del objeto del convenio específico entre el MSP, Biofarma y la empresa estatal Cubana Neuronic, para el Suministro de insumos para el programa de Detección Temprana y Escolar de Pérdidas Auditivas, a las bodegas del Beaterio del MSP y con fecha 01 de noviembre se realiza el acta de entrega - recepción de recibir a conformidad.</p>	Calderón Villota, César Augusto	09/01/2014 - 10:07 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
INDICADOR 5.- SERVICIO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS - Los cinco Centros de Rehabilitación: Ibarra, Portoviejo, Guayaquil, Quito y Cuenca se encuentran funcionando desde el período de agosto, se ha enviado recursos económicos a cada centro para ser potencializados.		
SEPTIEMBRE INDICADOR 5. CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL. Se encuentran en proceso de adjudicación para el mejoramiento y adecuación de los centros de rehabilitación integral en las ciudades de Portoviejo, Ibarra, Guayaquil y Cuenca.	Panchi Jima, Juan Carlos	13/10/2013 - 04:55 PM
AGOSTO 2013 INDICADOR 2.- TAMIZAJE VISUAL Firma del "convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y la Empresa Neuronic cuyo objetivo es brindar el servicio de mantenimiento técnico de los equipos audiológicos del programa "detección temprana y escolar de pérdidas auditivas". INDICADOR 4.- TAMIZAJE DE NEURODESARROLLO Se transfieren 147.747.94 dólares para el Programa Errores de Refracción para la adquisición de lentes y Plan Visión para cirugías de cataratas, pterigium, retinopatías a las provincias: Carchi, El Oro, Los Ríos, Napo, Pastaza, Orellana. INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACION INTEGRAL IMPLEMENTADOS Se visita a los cinco centros de rehabilitación integral de Portoviejo, Quito, Guayaquil, Ibarra, Cuenca para seguimiento en la inversión de los recursos económicos transferidos, ejecutadas el 50% de las transferencias realizadas. Portoviejo se encuentra en proceso de adquisición de inmobiliario, en Quito se estructura una hoja de ruta para el seguimiento de la inversión de los recursos transferidos, programada hasta el mes de Diciembre, en Guayaquil se encuentra en el proceso de adquisición de lencería, servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad, en Ibarra se encuentran fortaleciendo las áreas administrativas para cumplir con el requerimiento de inversión, Cuenca se encuentra en el proceso de remodelación de la infraestructura del centro de rehabilitación previo a su equipamiento. INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO Mediante memorando MSP-DNDRCES-2013-1613-M, se solicita reforma a la partida 530226 y se certifique el valor de 20.473,69 a la partida Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios, para la suscripción del "Convenio entre Ministerio de Salud Pública y la Fundación Ayudemos a Vivir" con el objeto de comprar servicios especializados para la atención a personas con trastornos del neurodesarrollo.	Panchi Jima, Juan Carlos	12/09/2013 - 04:49 PM
JULIO 2013 INDICADOR 2.- TAMIZAJE VISUAL Se realiza transferencia de 82.250 usd a la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, para la ejecución del plan visión que comprende: cirugías de cataratas, pterigium y errores de refracción. INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACION INTEGRAL IMPLEMENTADOS Se realiza una transferencia de \$ 646.868,27 para la potencialización y mejoramiento y una transferencia de \$ 251.968,90 para el mantenimiento, limpieza y seguridad para los cinco centros de rehabilitación de rehabilitación integral en las provincias de Manabí, Imbabura, Guayas, Azuay y Pichincha. Se elabora matriz de equipamiento priorizado para 10 servicios de rehabilitación a nivel nacional. INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO En espera de la firma de los convenios por parte de la República de Cuba, para los servicios de mantenimiento y para la adquisición de insumos de los equipos audiológicos. Se firma el convenio de transferencia de competencias de la calificación de las personas con discapacidad entre el Consejo Nacional de Discapacidades y el MSP. Se elabora la Nota reversal para la Cooperación de ejecución de los Proyectos para personas con discapacidad entre la Secretaría Técnica de Discapacidades y el MSP. Se elaboran las observaciones al Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades	Panchi Jima, Juan Carlos	05/08/2013 - 04:38 PM
JUNIO 2013 INDICADOR 2. TAMIZAJE VISUAL La Dirección Nacional de Discapacidades cuenta con el presupuesto para continuar con las actividades relacionadas al proyecto errores de refracción, definiéndose el instructivo a aplicarse, que luego de la validación se enviará a las respectivas provincias para que continúen con los tamizajes y entrega de lentes a los grupos escolares y adulto mayor, correspondiente al segundo semestre del año 2013.	Panchi Jima, Juan Carlos	05/07/2013 - 04:35 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>INDICADOR 4.- TAMIZAJE DE NEURODESARROLLO. Se ha reunido el comité técnico para definir la lista de medicamentos de acuerdo al perfil epidemiológico del Centro, se dispone de un listado de materiales y equipos informáticos Se cuenta con un plan de mantenimiento del espacio físico del Ceprondi.</p> <p>INDICADOR 5 - SERVICIOS DE CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL Hasta la fecha se ha priorizado 5 centros de tercer nivel de atención a nivel nacional en; Ibarra, Portoviejo, Guayaquil, Quito y Cuenca que se va a potencializar para el buen funcionamiento y la atención prioritaria a la población.</p> <p>.Elaborado el Instructivo del Centro de Rehabilitación Integral .Se cuenta con el borrador del Modelo de atención conjuntamente el médico funcional .Se ha coordinado con PIFEMEFS se ha realizado las fichas técnicas de equipamiento para estos centros especializados antes mencionados. .Construido el borrador del narrativo del Médico Funcional de las Centros de Rehabilitación Integral .Certificado los fondos para servicios básicos de los Centros de Rehabilitación Integral .Clasificadas las fichas técnicas de insumos y equipamiento con apoyo de PIFEMEFS</p>		
<p>MAYO 2013</p> <p>INDICADOR 2.- Tamizaje Visual Se gestionan partidas presupuestarias para la ejecución y cumplimiento de las metas establecidas en errores de refracción, plan visión y proyecto auditivo.</p> <p>INDICADOR 3.- Tamizaje Auditivo En análisis los convenios de cooperación Cuba-Ecuador para adquisición de insumos para los equipos auditológicos y para el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para el año 2013.</p> <p>INDICADOR 4.- Tamizajes de neurodesarrollo. El CEPRONDI ha desarrollado el tema de investigación cuya finalidad es Definir los parámetros neurocognitivo de 3 a 5 años, que permitió la construcción de una batería de neurodesarrollo, financiado por autogestión. Al momento de ha iniciado una investigación sobre retardo mental asociada con contaminación de plomo en la escuela de la Comunidad La Dolorosa ubicada en la Provincia del Azuay.} Coordinación con la Universidad de Cuenca con la Facultada de Ingeniería Electrónica para la construcción del Laboratorio del movimiento para pacientes con parálisis cerebral, además se está formalizando la creación de la maestría en neurodesarrollo. Se trámita en el MSP el financiamiento del CEPRONDI para su financiamiento, através de la zona 6. Se han realizado 4186 atenciones a personas con problemas de neurodesarrollo.</p> <p>ABRIL 2013 Elaboración del formato que solicitaba OPS para participacion de Plan Visión 2020 con la participacion de paises que conformaban el comite Vision 2020; actividad importante que prioriza el componente de errores de refraccion para implementacion de prevencion de ceguerra y deficit visual; proceso de preparación del nuevo plan estrategico 2014-2019 de la OPS/OMS. Este componente esta a la espera de la gestion financiera para el pago de tamizajes y lentes entregados. Se realiza campañas de prevencion en salud en las provincias de Imbabura, Orellana, Tungurahua, Sucumbios, Bolivar, Zamora Chinchipe, St. Domingo, Los Rios para deteccion temprana de discapacidades auditivas, visual y neonatal. 25 porfesionales capacitados en CIF nivel nacional para el sistema de recalificacion de discapacidades. Direccion esta realizando compromiso presidencial sobre actualizacion de datos a las personas con discapacidad que reciben el bono de desarrollo humano. IMPLEMENTACION DE CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL: Levantamiento de fichas tecnicas del equipamiento para implementación de los 5 centros de rehabilitacion integral barra, Guayaquil, Quito, Portoviejo, Cuenca. Gestion presupuestaria para insumos y consumibles de los talleres de ortesis y protesis a nivel nacional.</p> <p>MARZO 2013 Prevención Secundaria: Errores de refracción se recepta la justificación de las provincias de Cañar, Guayas y Morona Santiago para el pago de tamizajes y lentes entregados. Coordinación con las provincias de Imbabura, Orellana, Cañar, Tungurahua, Sucumbios, Bolivar, Zamora Chinchipe, St. Domingo, Los Rios para campañas de prevención de discapacidades a través de los tamizajes auidtivos, neonatal, errores de refracción. Profesionales seleccionados para capacitación de instructores para CIF nivel Nacional</p>	<p>Panchi Jima, Juan Carlos</p>	<p>12/06/2013 - 02:42 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Prevención terciaria: Detalle de equipamiento de los Centros de Rehabilitación Integral (CRI) Instructivo para los coordinadores zonales sobre funcionamiento de los CRI Designación presupuestaria a los hospitales provinciales para la adquisición de endoprotesis de rodilla y cadera. Gestión a través de la nota transversal para Traspaso VPR-MSP de proyecto de integración social y mejoramiento de la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad que requieren ortesis y prótesis Gestión para insumos de los tres talleres Quito, Guayaquil y Cuenca para su desarrollo. IMPLEMENTACION DE CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL: Se envía el instructivo a las coordinaciones zonales el funcionamiento de los centros de rehabilitación integral y tipología de 5 centros en Ibarra, Guayaquil, Quito, Portoviejo, Cuenca</p>		
	Panchi Jima, Juan Carlos	12/03/2013 - 12:01 PM
<p>FEBRERO DEL 2013</p> <p>PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN Errores De Refracción: Gestión para el pago de tamizajes realizados y lentes entregados Detección Temprana y escolar de discapacidades auditivas: Se realiza el pago de los profesionales de los servicios de audiología que cumplen las funciones de fonoaudiólogos. Gestión de Certificación presupuestaria para convenio de insumos audiológicos. Sistema de Calificación a Personas con Discapacidad: Se inicia con el proceso de la pre-selección para la capacitación de los instructores en CIF a nivel Nacional</p> <p>Detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo: Se realiza 2537 atenciones. (en este mes bajó la producción por los feriados y por la participación de los profesionales que participaron en la feria de la salud). CEPRONDI se realizó la feria de promoción de la salud, con participación activa de la coordinación zonal y la ciudadanía. Creación de la Malla curricular sobre propuesta de formación para profesionales</p> <p>ENERO 2013</p> <p>PROGRAMAS Y PROYECTOS EN PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES IMPLEMENTADOS</p> <p>Hasta la presente fecha se ha iniciado la fase de recopilación de información estadística de acceso a los servicios de salud por parte de las personas con discapacidad, de acuerdo a su edad, sexo, tipo de servicio, se ha iniciado la implementación de Rehabilitación Basada en la Comunidad en las provincias de Guayas y los Ríos.</p> <p>Errores de refracción: Se trabaja en coordinación con las zonas para prevención de discapacidad visual en coordinación con vicepresidencia para entrega de ayudas técnicas para personas con baja vision</p> <p>Detección Temprana y escolar de discapacidades auditivas: Hasta la fecha se mantienen los servicios de audiología se realiza la coordinación y organización para ferias de prevención de discapacidad en las provincias de Chimborazo, Puyo, Manabí, Azuay, Guayas, Esmeraldas. gestión para el pago de 57 profesionales que cumplen funciones de fonoaudiólogos para el proyecto auditivo.</p> <p>PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A TRATAMIENTOS DE HABILITACION, REHABILITACION E INTEGRACION.</p> <p>En este mes se ha establecido los lineamientos de equipamiento de los servicios de rehabilitación integral en coordinación con el programa de equipamiento del MSP. Se analiza y se define 11 provincias para implementar los servicios de oftalmología: Hospital San Vicente de Paúl, Francisco de Orellana, Hospital de Ambato, Hospital Gustavo Domínguez, Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Hospital Oskar Jandl, Hospital Vicente Corral Moscoso, Hospital Isidro Ayora, Centro de Rehabilitación Médica (CRM) de Guayaquil, Centro de Rehabilitación Médica (CRM) de Conocoto, Hospital Enrique Garcés. Elaborado el Perfil epidemiológico de discapacidad a nivel nacional, mismo que servirá como base para establecer la demanda de la población para la implementación de servicios para atención para personas con discapacidad.</p> <p>DETECCION PRECOZ E INTERVENCION OPORTUNA DE LAS CONDICIONES DE SALUD POTENCIALMENTE DISCAPACITANTES.</p>	Panchi Jima, Juan Carlos	12/03/2013 - 11:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En referencia a la Detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo en el mes de enero de realiza una atención de 3806 atenciones. Se prevee realizar la formación para profesionales en temas de neurodesarrollo en coordinación con la Universidad de Cuenca y Francia. Ceprondi Gestión el licenciamiento como un centro de especialidad. En espera de respuesta de jurídico respecto al tema de declaración de utilidad pública del terreno aledaño al Centro.</p> <p>Se fusiono el CAO- Ceprondi (Se está haciendo promoción de la salud en las diferentes escuelas</p> <p>Capacitaciones y formación Continua sobre de actualización en neurodesarrollo</p> <p>. Se realizó auditoría, arrojando resultados positivos sobre el manejo del centro (Consulta externa).</p> <p>.Se está reportando información cuatrimestral para rendición de cuentas a la secretaria Nacional de Transparencia de la Información Pública, y los informes mensuales a la Ley Orgánica de Transparencia se Información Pública.</p>		

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>2- NACIONAL. Económico. El retraso en la asignación de recursos a inicio de año CAUSARÍA el incumplimiento de actividades planificadas en los tiempos establecidos.</p>	29/03/2016	Alvaro Antonio Jaramillo Sarmiento	50 %	80	40	1/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Implementación y Equipamiento de las unidades y servicios de rehabilitación	4-Inicio de Trabajo	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.0
2	Transferencia de presupuesto a la Coordinaciones Zonales y Unidades ejecutoras para que inicien las acciones correspondientes a la ejecución de los objetivos del proyecto	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	1.66
3	Adquisición de equipo informático para calificación de personas con discapacidad y adquisición de impresoras para carnets especiales a nivel nacional para todas las unidades calificadoras	9-Entregables Formales	30/04/2014		01/04/2014		Sí	1.66
4	Firma del Convenio de centros oftalmologicos	9-Entregables Formales	30/04/2014		31/03/2014		Sí	1.66

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	Elaboración de 9 talleres para las 9 zonas sobre prescripción de ayudas técnicas	9-Entregables Formales	09/06/2014		09/06/2014		Sí	1.66
6	Contratación de consultoría para la elaboración de la normativa de atención a personas con discapacidad	3-Adjudicación	28/06/2014		28/06/2014		Sí	1.67
7	Entrega de lentes a nivel sierra Junio 2014	9-Entregables Formales	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.67
8	Implementación de ajuste en el Sistema de Calificación de personas con discapacidad para el registro de prescripción de ayudas técnicas	9-Entregables Formales	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.67
9	Compra Equipamiento de rehabilitación Centros de Rehabilitación integral (Portoviejo, Ibarra, Guayaquil, Quito)	3-Adjudicación	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.67
10	Cambio de equipo de rehabilitación de 20 hospitales de segundo y tercer nivel.	3-Adjudicación	31/08/2014		31/08/2014		Sí	1.67
11	Implementación de 2 servicios de cuidados paliativos	4-Inicio de Trabajo	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.67
12	Realización de Taller internacional para Odontología para personas con discapacidad	9-Entregables Formales	04/11/2014		04/11/2014		Sí	1.67
13	Entrega de lentes a nivel costa Diciembre 2014	9-Entregables Formales	30/12/2014		30/12/2014		Sí	1.67
14	EJECUCIÓN: Recursos financieros para la adquisición de equipamiento, insumos y mobiliario transferido a los Centros Oftalmológicos ubicados en Ballenita, Latacunga y Machala.	9-Entregables Formales	04/03/2015		04/03/2015		Sí	1.5
15	EJECUCIÓN: Recursos económicos destinados a la adquisición de material de osteosíntesis y endoprótesis asignados.	5-Entregables Intermedios	06/03/2015		06/03/2015		Sí	1.5
16	EJECUCIÓN: Recursos económicos destinados a la adecuación del Área de Estimulación Temprana dentro de la Zona 8 en el Distrito 09D03 Garcia Moreno.	5-Entregables Intermedios	16/03/2015		16/03/2015		Sí	1.5
17	EJECUCIÓN: Congreso de Odontología 2014 liquidado .	9-Entregables Formales	26/03/2015		26/03/2015		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Recursos económicos destinados a la adquisición de dispositivos para la mejora de trastornos auditivos a nivel nacional asignados.	9-Entregables Formales	06/05/2015		06/05/2015		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Recursos financieros para continuidad del Convenio con MIDENA transferidos.	9-Entregables Formales	08/05/2015		08/05/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
20	EJECUCIÓN: Convenio de pago con Neuronic 2012 solventado y liquidado.	9-Entregables Formales	11/05/2015		11/05/2015		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Recursos económicos para la adquisición de insumos y equipamiento destinados para la ejecución de plan visión a nivel nacional asignados.	3-Adjudicación	14/05/2015		14/05/2015		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Recursos financieros destinados para la compra de servicios de cirugía a la Unidades Ejecutoras asignado.	5-Entregables Intermedios	14/05/2015		14/05/2015		Sí	1.5
23	EJECUCIÓN: Informe para cierre de Proyectos en SETEDIS entregado.	9-Entregables Formales	11/06/2015		11/06/2015		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Proyecto Unificado para ejecución en el MSP entregado a la Coordinación General de Planificación.	9-Entregables Formales	11/06/2015		11/06/2015		Sí	1.5
25	EJECUCIÓN: Convenio para servicio de fisioterapia con el Gobierno Cuba legalizado.	9-Entregables Formales	03/07/2015		03/07/2015		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Equipos informáticos desde SETEDIS traspasados.	9-Entregables Formales	08/07/2015		08/07/2015		Sí	1.5
27	EJECUCIÓN: Adecuación del Área de Estimulación Temprana dentro de la Zona 8 en el Distrito 09D03 García Moreno realizada.	9-Entregables Formales	03/08/2015		03/08/2015		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Convenio ampliado con SETEDIS suscrito.	9-Entregables Formales	11/08/2015		11/08/2015		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Recursos económicos para la adquisición de equipos destinados para solventar casos de atención domiciliaria asignados.	5-Entregables Intermedios	17/08/2015		17/08/2015		Sí	1.5
30	EJECUCIÓN: Campaña Comunicacional Manuela Espejo 2014 liquidada.	9-Entregables Formales	18/08/2015		18/08/2015		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Recursos económicos destinados a la adquisición de implantes cocleares y accesorios asignados.	5-Entregables Intermedios	04/09/2015		04/09/2015		Sí	1.5
32	EJECUCIÓN: Recursos económicos destinados para la adquisición de equipamiento de audiología destinado para el Hospital Vicente Corral Moscoso (Cuenca) asignados.	5-Entregables Intermedios	04/09/2015		04/09/2015		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Equipos informáticos traspasados desde SETEDIS distribuidos.	9-Entregables Formales	11/09/2015		11/09/2015		Sí	1.5
34	EJECUCIÓN: Insumos destinados para la ejecución	9-Entregables Formales	15/10/2015		15/10/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de plan visión a nivel nacional adquiridos.							
35	EJECUCIÓN: Guías y Normas en Cuidados Paliativos impresos y distribuidos.	9-Entregables Formales	30/10/2015		30/10/2015		Sí	1.5
36	EJECUCIÓN: Material Lúdico y didáctico para los 29 servicios de rehabilitación adquirido.	9-Entregables Formales	30/10/2015		30/10/2015		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN: Recursos económicos para la adquisición de insumos y adecuaciones destinados para los talleres de órtesis y prótesis asignados.	3-Adjudicación	30/10/2015		30/10/2015		Sí	1.5
38	EJECUCIÓN: Personal Psicólogo y Trabajadoras Sociales a nivel nacional contratadas.	9-Entregables Formales	31/10/2015		31/10/2015		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Personal del taller de órtesis y prótesis Conocoto contratado.	9-Entregables Formales	13/11/2015		13/11/2015		Sí	1.5
40	EJECUCIÓN: Plan de Mantenimiento Interno de Equipos Audiológicos implementado.	9-Entregables Formales	16/11/2015		16/11/2015		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Lentes para niños entre 5 y 14 años tamizados entregados.	9-Entregables Formales	20/11/2015		20/11/2015		Sí	1.5
42	EJECUCIÓN: Personal encargado de Cuidados Paliativos capacitado.	9-Entregables Formales	20/11/2015		20/11/2015		Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Dispositivos para la mejora de trastornos auditivos (audífonos) a nivel nacional adquiridos.	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	1.5
44	EJECUCIÓN: Implantes cocleares y accesorios adquiridos.	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: Insumos y material de órtesis y prótesis en los talleres de Guayaquil y Loja adquiridos.	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	1.5
46	EJECUCIÓN: Insumos, equipamiento y mobiliario de los Centros Oftalmológicos adquiridos.	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	1.0
47	EJECUCIÓN: Evento por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad realizado.	9-Entregables Formales	03/12/2015		03/12/2015		Sí	1.5
48	EJECUCIÓN: Brigadas de Discapacidades en la Isla Puná, Paquisha, Galápagos y Taisha realizadas.	9-Entregables Formales	11/12/2015		11/12/2015		Sí	1.0
49	EJECUCIÓN: Centro de Mecanizado del Taller de Órtesis y Prótesis Conocoto operativo.	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	1.5
50	EJECUCIÓN: Planificación 2016 planteada.	5-Entregables Intermedios	17/12/2015		17/12/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
51	EJECUCIÓN: Convenio de mantenimiento Neuronic 2014 - 2015 liquidado.	9-Entregables Formales	31/12/2015		28/12/2015		Sí	1.0
52	EJECUCIÓN: Material de Osteosíntesis y Endoprótesis adquirido.	3-Adjudicación	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.5
53	EJECUCIÓN: Recursos destinados a territorio para solventar cuentas de arrastre, transferido	5-Entregables Intermedios	15/01/2016		15/01/2016		Sí	0.6
54	EJECUCIÓN: Recursos a Nivel Nacional para realizar la adquisición de ayudas técnicas, material para rehabilitación, ortesis y prótesis, equipamiento de unidades calcificadoras, transferido	5-Entregables Intermedios	05/02/2016		05/02/2016		Sí	0.6
55	EJECUCION: Recursos en territorio destinado para la contratación de personal, transferido	5-Entregables Intermedios	23/02/2016		23/02/2016		Sí	0.6
56	EJECUCIÓN: Análisis de priorización de ayudas técnicas en base a inventarios, producción y proyección, realizado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.6
57	EJECUCIÓN: Proceso de adquisición de insumos, partes y piezas para los Talleres de órtesis y prótesis (Guayaquil, Quito y Loja), avalado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.3
58	EJECUCIÓN: Primer pedido para atención de casos de Programa de Atención Domiciliaria, remitido.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.7
59	EJECUCIÓN: Proceso de adquisición de ayudas técnicas (sillas de ruedas y pañales) a nivel nacional, avalado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.3
60	EJECUCIÓN: Procesos para adquisición de Material lúdico y didáctico en 6 Unidades, avalado	5-Entregables Intermedios	06/05/2016		06/05/2016		Sí	0.3
61	EJECUCIÓN: Análisis de priorización de Implantes cocleares y accesorios para adquisición en Hospital Baca Ortiz, Hospital Vicente Corral Moscoso, Hospital Icaza Bustamante, elaborado.	5-Entregables Intermedios	13/05/2016		13/05/2016		Sí	0.7
62	EJECUCIÓN: Capacitaciones de Cuidados Paliativos realizadas.	5-Entregables Intermedios	20/05/2016		20/05/2016		Sí	0.75
63	EJECUCIÓN: Sistema de prescripción, bodegaje y entrega de ayudas técnicas, implementado.	5-Entregables Intermedios	23/06/2016		23/06/2016		Sí	1.7
64	EJECUCIÓN: Proceso de adquisición de ayudas técnicas auditivas a nivel nacional iniciado.	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		29/07/2016		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
65	EJECUCIÓN: Insumos, partes y piezas para los talleres de órtesis y prótesis adquiridos	5-Entregables Intermedios	15/08/2016		15/08/2016		Sí	1.9
66	EJECUCIÓN: Ayudas técnicas (sillas de rueda y pañales) a nivel nacional adquiridas.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	1.9
67	EJECUCIÓN: Errores de refracción a nivel nacional adquiridos.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	1.9
68	EJECUCIÓN: Recursos a nivel nacional subutilizados redistribuidos.	5-Entregables Intermedios	11/10/2016	11/10/2016			No	0.5
69	EJECUCIÓN: Equipamiento para casos de atención domiciliaria entregado.	5-Entregables Intermedios	14/10/2016	14/10/2016			No	1.9
70	EJECUCIÓN: Insumos, repuestos y actualizaciones de implante coclear adquiridos.	5-Entregables Intermedios	14/10/2016	14/10/2016			No	1.8
71	EJECUCIÓN: Proceso de adquisición de implantes cocleares (Hospital Baca Ortiz, Hospital Vicente Corral Moscoso, Hospital Icaza Bustamante), iniciado.	5-Entregables Intermedios	14/10/2016	14/10/2016			No	1.8
72	EJECUCIÓN: Ayudas técnicas auditivas a nivel nacional adquiridas.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016	31/10/2016			No	1.8
73	EJECUCIÓN: Ayudas técnicas (colchones, cojines, sillas posturales) a nivel nacional adquiridas.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016	30/11/2016			No	1.8
74	EJECUCIÓN: Equipamiento para casos de atención domiciliaria adquirido.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016	30/11/2016			No	1.9
75	EJECUCIÓN: Equipamiento para tamizaje auditivo a nivel nacional, distribuido	5-Entregables Intermedios	30/11/2016	30/11/2016			No	1.9
76	EJECUCIÓN: Procesos de arrastres devengados	5-Entregables Intermedios	30/11/2016	30/11/2016			No	1.0
77	EJECUCIÓN: Sistema de Calificación e Identificación de personas con discapacidad validado	5-Entregables Intermedios	15/12/2016	15/12/2016			No	0.38
78	COMPLETADO: Informe final del proyecto	5-Entregables Intermedios	30/12/2016	30/12/2016			No	0.37

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión-Atención Integral a personas con discapacidad	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	22/09/2016
2	REALIZADA 22 DE AGOSTO DE 2016	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	22/08/2016
3	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	19/08/2016
4	Persona con discapacidad Jul 2016	Chavez Bajaña, Kharla del Rocío	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	01/08/2016
5	Verificación del avance del proyecto	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	22/06/2016

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
6	Seguimiento Atención Integral e Integradora provincia de Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	20/06/2016
7	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	21/04/2016
8	ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	12/04/2016
9	SUPERVISIÓN EXITOSA	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	30/03/2016
10	Etapas preventivas de discapacidades	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	31/03/2016
11	PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD	Chavez Bajaña, Kharla del Rocío	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/03/2016
12	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON ECHEANDIA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	28/03/2016
13	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CHILLANES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/02/2016
14	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	29/02/2016
15	Proyecto se ejecuta en territorio	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	18/02/2016
16	Supervisión positiva se pudo verificar el funcionamiento del proyecto en el Distrito de Salud Morona 14D01 de acuerdo al hito 54	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	17/02/2016
17	EL PROYECTO SI SE EJECUTÓ EN EL CANTON LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	25/01/2016
18	Existe escasez en las ayudas técnicas que corresponden a sillas de ruedas por lo que es necesario solicitar su abastecimiento para cubrir la demanda	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	29/06/2015
19	Supervisión exitosa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	30/12/2015
20	SUPERVISION REALIZADA 28-12-2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	28/12/2015
21	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	28/12/2015
22	Proyecto en ejecución en la provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	27/12/2015
23	Constatación de aplicación de Atención Integral e Integradora a PCD, rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel de la Provincia de Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	17/12/2015
24	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	27/11/2015
25	Supervisión positiva del proyecto en el Distrito 14D03 de acuerdo al hito 41	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	27/11/2015
26	PROYECTO SI SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON GUARANDA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/10/2015
27	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	19/11/2015
28	Supervisión Atención Integral e Integradora a personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel nacional	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	24/11/2015
29	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	19/10/2015
30	Supervisión-Atención Integral e Integradora a personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel nacional	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	27/08/2015
31	Rosario Cortez	Cortez Rodriguez, Doriz Rosario	{PR} - Provincia - ORELLANA	17/09/2013
32	" Avance del proceso de calificación a personas con discapacidad en el año 2014 en la provincia de Zamora Chinchipe"	Esparza Aguirre, Diego Fernando	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	30/09/2014
33	SUPERVISION REALIZADA 23-09-2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	23/09/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
34	PROYECTO CUMPLE SEGÚN LO PLANIFICADO	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	11/09/2015
35	Atención Integral e Integradora a personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel nacional	Bucaram Loaiza, Gustavo Xavier	{PR} - Provincia - PICHINCHA	30/07/2015
36	EL PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	25/08/2015
37	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTO CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	10/09/2015
38	Cambio de equipo de rehabilitación e Implementación de servicios de cuidados paliativos	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	27/10/2014
39	FALTA DE EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	13/02/2014
40	Proyecto en San Miguel de Bolívar presenta varias necesidades .	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	16/05/2014
41	Articulación con instituciones los servicios integrales a personas con discapacidad	Gómez Villao, Pedro Rubén	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	27/05/2015
42	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CHILLANES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/06/2015
43	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	29/06/2015
44	Supervisión Atención Integral e Integradora a personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel nacional	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	28/05/2015
45	EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTÓN LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	18/05/2015
46	Seguimiento del Proyecto Atención Integral e Integradora a personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud en Galápagos	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	14/03/2014
47	PROYECTO EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	26/06/2015
48	Supervisión Positiva atención domiciliaria a pacientes.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/06/2015
49	SEGUIMIENTO ATENCIÓN INTEGRAL GALAPAGOS	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	26/05/2015
50	PROYECTO NO PRESENTA DIFICULTADES EN EL CANTON ECHEANDIA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/04/2015
51	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/04/2015
52	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	20/02/2015
53	Seguimineto del proyecto en territorio	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	29/01/2015
54	Supervisión del 30/01/2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	30/01/2015
55	Supervisión del 24-12-2014	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	25/12/2014
56	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	29/12/2014
57	Proyecto en ejecucion	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/12/2014
58	Informe_k006_MSP_TALLER_DISCAPACIDAD	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	18/12/2014
59	Proyecto se ejecuta con normalidad y atención oportuna	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	26/11/2014
60	Proyecto en Ejecución	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	20/11/2014
61	Proyecto_K006_MSP_Taller_Integral_Salud_Discapacitados	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	13/11/2014
62	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	30/09/2014
63	SEGUIMIENTO "PROGRAMA"	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	29/08/2014

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
64	Errores de refracción	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/05/2014
65	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	23/05/2014
66	SUPERVISIÓN	Trujillo Castro, Jorge Eduardo	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	30/09/2013
67	Supervisión	Villamarin Carrascal, Julio Marcelo	{PR} - Provincia - IMBABURA	29/11/2013
68	EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	26/02/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Lentes Entregados a Niños, Niñas y Adolescentes con deficiencia visual (5 a 14 años)		36.50 %	0.3	0.1095	01/05/2015	May-Ago
2	Número de Unidades Operativas Equipadas con Servicios de Rehabilitación.		75.00 %	8	6	01/01/2015	Abr-Jun
3	Número de personas con discapacidad con Atención Domiciliaria atendidos con equipamiento		100.00 %	35	35	01/04/2015	Abr-Jun
4	Porcentaje de Audífonos Entregados a Personas con Discapacidad Auditiva.		25.89 %	0.76	0.1968	01/01/2016	May-Ago
5	Porcentaje de Entrega de Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad.		37.29 %	0.66	0.2461	01/01/2016	May-Ago
6	Porcentaje de órtesis y prótesis entregadas a personas con discapacidad		96.43 %	0.7	0.675	01/01/2016	May-Ago


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	35,893,664.83 **
Costo Total:	41,180,502.24
Total Devengado:	30,612,400.83
% Costo Total Devengado:	74.34 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 74.34 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	44,122,518.38	8,138,720.20	0.00	52,261,238.58
Ppto. Externo Planeado	0.00	8,138,720.20	0.00	8,138,720.20
Ppto. Aprobado Inicial	40,717,264.98	8,138,720.20	0.00	48,855,985.18
Ppto. Codificado	32,947,036.39	8,720,727.53	0.00	41,667,763.92
Ppto. Comprometido	27,401,178.53	4,034,496.53	0.00	31,435,675.06
Planeado - Codificado (2016)		-582,007.33		
Programado a Devengar	32,846,236.39	8,356,727.94	0.00	41,202,964.33
Ppto. Devengado	27,536,936.89	3,075,463.94	0.00	30,612,400.83
Estimado a fin de año	* 27,536,936.89	0.00	0.00	27,536,936.89
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	5,309,299.50	8,356,727.94	0.00	13,666,027.44
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 83.84 %	36.80 %	0.00 %	74.30 %
Ppto. Codificado 998	672,916.00	292,180.10	0.00	965,096.10
Ppto. Devengado 998	672,916.00	108,024.31	0.00	780,940.31

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

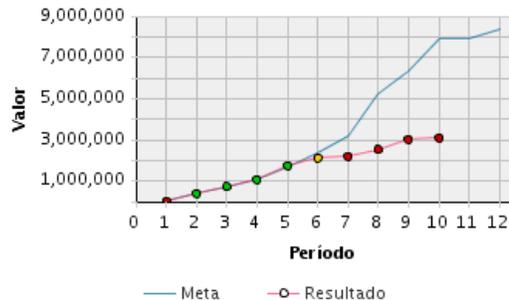

Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	10,071.08	13,922.34	10,071.08	13,922.34	138.24 %		0.17 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	388,990.21	388,333.95	399,061.29	402,256.29	100.80 %		4.81 %
Mar	303,857.23	319,473.41	702,918.52	721,729.70	102.68 %		8.64 %
Abr	372,044.57	355,040.54	1,074,963.09	1,076,770.24	100.17 %		12.89 %
May	641,493.28	654,773.48	1,716,456.37	1,731,543.72	100.88 %		20.72 %
Jun	677,159.10	380,119.19	2,393,615.47	2,111,662.91	88.22 %		25.27 %
Jul	763,959.18	94,733.21	3,157,574.65	2,206,396.12	69.88 %		26.40 %
Ago	2,045,831.89	338,244.14	5,203,406.54	2,544,640.26	48.90 %		30.45 %
Sep	1,096,996.86	487,878.25	6,300,403.40	3,032,518.51	48.13 %		36.29 %
Oct	1,623,428.15	42,945.43	7,923,831.55	3,075,463.94	38.81 %		36.80 %
Nov	25,491.19		7,949,322.74				
Dic	407,405.20		8,356,727.94				
Total	8,356,727.94	3,075,463.94					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
8	Incrementar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad MEDIANTE la detección oportuna, registro efectivo y tratamiento adecuado.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		TDR_NEURODESARROLLO_17_DE_FEBRERO_DEL_2014	13/03/2014
2	A.1 Asociación Hito 14_Quipux asignación de recursos	A.1_Asociación_Hito_14_Quipux_asignación_de_recursos.pdf	13/01/2016
3	A.2 Asociación Hito 15_Unidades con osteosíntesis y endoprótesis	A.2_Asociación_Hito_15_Unidades_con_osteosíntesis_y_endoprótesis.pdf	13/01/2016
4	A.3 Asociación Hito 15_Quipux asignación osteosíntesis y endoprótesis	A.3_Asociación_Hito_15_Quipux_asignación_osteosíntesis_y_endoprótesis.pdf	13/01/2016
5	A.4 Asociación Hito 16_Quipux asignación estimulación temprana	A.4_Asociación_Hito_16_Quipux_asignación_estimulación_temprana.pdf	13/01/2016
6	A.5 Asociación Hito 17_Quipux financiando congreso de odontología	A.5_Asociación_Hito_17_Quipux_financiando_congreso_de_odontología.pdf	13/01/2016
7	A.6 Asociación Hito 18_Listado de documentos de informado a unidades para compra de audífonos	A.6_Asociación_Hito_18_Listado_de_documentos_de_informado_a_unidades_para_compra	13/01/2016
8	A.7 Asociación Hito 18_Quipux asignación audífonos	A.7_Asociación_Hito_18_Quipux_asignación_audífonos.pdf	13/01/2016
9	A.8 Asociación Hito 19_Validación de reforma para el traspaso de recursos al MIDENA	A.8_Asociación_Hito_19_Validación_de_reforma_para_el_traspaso_de_recursos_al_MIDENA	13/01/2016
10	A.9 Asociación Hito 20_Solicitud pago Neuronic 2012	A.9_Asociación_Hito_20_Solicitud_pago_Neuronic_2012.pdf	13/01/2016
11	B.1 Asociación Hito 21 y 22_Quipux financiamiento errores de refracción y plan visión	B.1_Asociación_Hito_21_y_22_Quipux_financiamiento_errores_de_refracción_y_plan_visión	13/01/2016
12	B.2 Asociación Hito 23_Quipux remitiendo Informe de cierre de proyectos	B.2_Asociación_Hito_23_Quipux_remitiendo_Informe_de_cierre_de_proyectos.pdf	13/01/2016
13	B.3 Asociación Hito 24_Quipux envío del documento del proyecto	B.3_Asociación_Hito_24_Quipux_envío_del_documento_del_proyecto.pdf	13/01/2016
14	B.4 Asociación Hito 25_Convenio de Fisiatría Legalizado	B.4_Asociación_Hito_25_Convenio_de_Fisiatría_Legalizado.pdf	13/01/2016
15	B.5 Asociación Hito 26_Acta de Transferencia de bienes desde SETEDIS	B.5_Asociación_Hito_26_Acta_de_Transferencia_de_bienes_desde_SETEDIS.pdf	13/01/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	B.6 Asociación Hito 27_Informe de Ejecución Área de Estimulación Temprana	B.6_Asociación_Hito_27_Informe_de_Ejecución_Área_de_Estimulación_Temprana.pdf	14/01/2016
17	B.7 Asociación Hito 28_Solicitud de Renovación Convenio SETEDIS	B.7_Asociación_Hito_28_Solicitud_de_Renovación_Convenio_SETEDIS.pdf	15/01/2016
18	B.8 Asociación Hito 30_Comprobante de Pago Campaña Manuela Espejo	B.8_Asociación_Hito_30_Comprobante_de_Pago_Campaña_Manuela_Espejo.pdf	15/01/2016
19	B.9 Asociación Hito 31_Detalle de Asignaciones y Códigos de procesos de compra de accesorios e implantes cocleares	B.9_Asociación_Hito_31_Detalle_de_Asignaciones_y_Códigos_de_procesos_de_compra_de accesorios e implantes cocleares	15/01/2016
20	Borrador del modelo de gestión de los centros de rehabilitación.	Modelo_de_gestión.pdf	05/07/2013
21	Borrador del médico funcional de los centros de Rehabilitación integral.	medico_funcional-Centro_de_Rehabilitacion_Integral.docx	05/07/2013
22	C.1 Asociación Hito 32_Quipux asignación Hospital Vicente Corral Moscoso	C.1_Asociación_Hito_32_Quipux_asignación_Hospital_Vicente_Corral_Moscoso.pdf	15/01/2016
23	C.2 Asociación Hito 33_Quipux Distribución de Equipos	C.2_Asociación_Hito_33_Quipux_Distribución_de_Equipos.pdf	15/01/2016
24	C.3 Asociación Hito 34_Quipux Asignación de recursos para Insumos de Plan Visión	C.3_Asociación_Hito_34_Quipux_Asignación_de_recursos_para_Insumos_de_Plan_Visión.pdf	15/01/2016
25	C.4 Asociación Hito 36_Procesos de Adquisición de Material Lúdico y Didáctico en 29 Unidades	C.4_Asociación_Hito_36_Procesos_de_Adquisición_de_Material_Lúdico_y_Didáctico_en_29 Unidades	15/01/2016
26	C.5 Asociación Hito 37_Asignación recursos para talleres de órtesis y prótesis	C.5_Asociación_Hito_37_Asignación_recursos_para_talleres_de_órtesis_y_prótesis.pdf	15/01/2016
27	C.6 Asociación Hito 38_Contrataciones Trabajadoras Sociales y Psicólogos	C.6_Asociación_Hito_38_Contrataciones_Trabajadoras_Sociales_y_Psicólogos.xls	15/01/2016
28	C.7 Asociación Hito 39_Solicitud Contratación Personal del Taller de Conocoto	C.7_Asociación_Hito_39_Solicitud_Contratación_Personal_del_Taller_de_Conocoto.pdf	15/01/2016
29	C.8 Asociación Hito 40_Información servicio de mantenimiento equipos audiológicos	C.8_Asociación_Hito_40_Información_servicio_de_mantenimiento_equipos_audiológicos.pdf	15/01/2016
30	C.9 Asociación Hito 41_Detalle de entrega de lentes	C.9_Asociación_Hito_41_Detalle_de_entrega_de_lentes.xls	15/01/2016
31	Capacitación Convenio Servicio Mantenimiento Equipos Audiológicos	MSP-DND-2014-0358-M.pdf	05/12/2014
32	COMPONENTE REHABILITACIÓN OCTUBRE 2014	REHABILITACIÓN_Octubre_2014-1.zip	10/11/2014
33	Comprobante de ejecución de gasto	Respaldo_r.e._auditivo.png	09/01/2014
34	Convenio de Fisiatría 2015 - 2016	CONVENIO_DE_FISIATRÍA_2015_-_2016.pdf	05/08/2015
35	Convenio Fundación San Juan de Jerusalem	MSP-DND-2014-0177-O.pdf	05/12/2014
36	CONVENIO INSUMOS NEURONIC	convenio_insumos_00117_neuronic.pdf	10/02/2014
37	CONVENIO MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOLOGICO NEURONIC 2013	convenio_mantenimiento_neuronic_2013.pdf	10/02/2014
38	Cronograma de mantenimiento 2 agosto 2014	MSP-PAIDRCS-2014-0597-M.pdf	12/08/2014
39	Cronograma de mantenimiento agosto 2014	MSP-PAIDRCS-2014-0565-M.pdf	12/08/2014
40	D.1 Asociación Hito 42_Nómina de Asistentes a Capacitación en Cuidados Paliativos	D.1_Asociación_Hito_42_Nómina_de_Asistentes_a_Capacitación_en_Cuidados_Paliativos.xls	15/01/2016
41	D.2 Asociación Hito 43_Procesos de adquisición de audífonos	D.2_Asociación_Hito_43_Procesos_de_adquisición_de_audífonos.xls	15/01/2016
42	D.3 Asociación Hito 44_Códigos de procesos de compra de accesorios e implantes cocleares	D.3_Asociación_Hito_44_Códigos_de_procesos_de_compra_de accesorios e implantes cocleares	15/01/2016
43	D.4 Asociación Hito 46_Informe de Ejecución Asignación de Centros Oftalmológicos	D.4_Asociación_Hito_46_Informe_de_Ejecución_Asignación_de_Centros_Oftalmológicos.pdf	05/03/2016
44	D.5 Asociación Hito 47_Informes Día de las Discapacidades	D.5_Asociación_Hito_47_Informes_Día_de_las_Discapacidades.zip	15/01/2016
45	D.6 Asociación Hito 48_Brigadas Puná, Galápagos, Taisha y Paquisha	D.6_Asociación_Hito_48_Brigadas_Puná_Galápagos_Taisha_y_Paquisha.zip	15/01/2016
46	D.7 Asociación Hito 49_Apoyo técnico gestión del Centro de Mecanizado	D.7_Asociación_Hito_49_Apoyo_técnico_gestión_del_Centro_de_Mecanizado.pdf	15/01/2016
47	D.8 Asociación Hito 50_Quipux remisión PAPP	D.8_Asociación_Hito_50_Quipux_remisión_PAPP.pdf	15/01/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
48	D.9 Asociación Hito 51_Solicitud del segundo pago del Convenio 000056 Neuronic	D.9_Asociación_Hito_51_Solicitud_del_segundo_pago_del	05/01/2016
49	E.1 Asociación Hito 51_Estado proceso de liquidación Contrato Neuronic	E.1_Asociación_Hito_51_Estado_proceso_de_liquidación_Con	15/01/2016
50	E.2 Asociación Hito 52_Detalle de procesos de adquisición de osteosíntesis y endoprótesis	E.2_Asociación_Hito_52_Detalle_de_procesos_de_adquisición	15/01/2016
51	E.3 Asociación Hito 29_Quipux informando asignación Atención Domiciliaria	E.3_Asociación_Hito_29_Quipux_informando_asignación_Aten	16/01/2016
52	E.4 Asociación Hito 35_Acta de Entrega Recepción Guías de Cuidados Paliativos	E.4_Asociación_Hito_35_Acta_de_Entrega_Recepción_Guías	16/01/2016
53	E.5 Asociación Hito 45_Detalle de procesos de adquisición de Material para los talleres de Órtesis y Prótesis	E.5_Asociación_Hito_45_Detalle_de_procesos_de_adquisición	18/01/2016
54	E.6 Asociación Hito 53 y 54_Reporte a Febrero 2016	E.6_Asociación_Hito_53_y_54_Reporte_a_Febrero_2016.xls	13/02/2016
55	E.7 Asociación Hito 55_Confirmación de Reforma de Sueldos Efectiva	E.7_Asociación_Hito_55_Confirmación_de_Reforma_de_Sueld	06/03/2016
56	E.7 Asociación Hito 55_Reforma Presupuestaria Sueldos	E.7_Asociación_Hito_55_Reforma_Presupuestaria_Sueldos.p	04/03/2016
57	E.7 Asociación Hito 55_Reforma Presupuestaria Sueldos	E.7_Asociación_Hito_55_Reforma_Presupuestaria_Sueldos.p	04/03/2016
58	E.8_Asociación_Hito_56_Análisis de priorización de ayudas técnicas en base a inventarios producción y proyección	E.8_Asociación_Hito_56_Análisis_de_priorización_de_ayudas	16/03/2016
59	E.9_Asociación_Hito_57_Proceso de adquisición de insumos partes y piezas para los Talleres de órtesis y prótesis (Guayaquil Quito y Loja) avalado	E.9_Asociación_Hito_57_Proceso_de_adquisición_de_insumos	16/05/2016
60	Elaborado instructivo para errores de refracción.	INSTRUCTIVO_ERRRORES_DE_REFRACCION-1.doc	05/07/2013
61	F.1_Asociación_Hito_58_Primer pedido para atención de casos de Programa de Atención Domiciliaria, remitido.	F.1_Asociación_Hito_58_Primer_pedido_para_atención_de_c	16/05/2016
62	F.2_Asociación_Hito_59_Proceso de adquisición de ayudas técnicas (sillas de ruedas y pañales) a nivel nacional, avalado.	F.2_Asociación_Hito_59_Proceso_de_adquisición_de_ayudas	16/05/2016
63	F.3_Asociación_Hito_60_Procesos para adquisición de Material lúdico y didáctico en 6 Unidades, avalado	F.3_Asociación_Hito_60_Procesos_para_adquisición_de_Mate	16/05/2016
64	F.4_Asociación_Hito_61 Análisis de priorización de Implantes cocleares y accesorios para adquisición en Hospital Baca Ortiz, Hospital Vicente Corral Moscoso, Hospital Icaza Bustamante.	F.4_Asociación_Hito_61_Análisis_de_priorización_de_Implan	16/05/2016
65	F.5_Asociación_Hito_62 Capacitaciones de Cuidados Paliativos Realizadas	F.5_Asociación_Hito_62_Capacitaciones_de_Cuidados_Paliat	11/07/2016
66	F.6_Asociación_Hito_63 Implementación del Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas	F.6_Asociación_Hito_63_Implementación_del_Sistema_de_P	16/07/2016
67	F.7_Asociación_Hito_64 Detalle de procesos financiados para la compra de A.T. Auditivas	F.7_Asociación_Hito_64_Detalle_de_procesos_financiados	02/08/2016
68	F.8_Asociación_Hito_65_Insumos, partes y piezas para los talleres de órtesis y prótesis adquiridos	F.8_Asociación_Hito_65_Insumos_partes_y_piezas_para	06/09/2016
69	F.9_Asociación_Hito_66_Ayudas técnicas (sillas de rueda y pañales) a nivel nacional adquiridas	F.9_Asociación_Hito_66_Ayudas_técnicas_(sillas_de_rueda	09/09/2016
70	G.1_Asociación_Hito_67 Errores de refracción a nivel nacional adquiridos	G.1_Asociación_Hito_67_Errores_de_refracción_a_nivel_nac	06/09/2016
71	INDICADOR 1.- DICIEMBRE	CONCENTRADO_ENTREGA_A.T._20-12-2014.xls	13/01/2015
72	INDICADOR 2.- DICIEMBRE	CONSOLIDADO_CUIDADOS_PALIATIVOS.xls	13/01/2015
73	INDICADOR 3 Y 4.- DICIEMBRE	Matriz_Producción_Diciembre_2014.xls	13/01/2015
74	INDICADOR 3 Y 4.- NOVIEMBRE	Matriz_Producción_Noviembre_2014.xls	13/01/2015
75	INDICADOR 5 SEPTIEMBRE 2014	INDICADOR_5.-plan_piloto_denver_II.pdf	08/10/2014
76	INDICADOR 5.1.- SEPTIEMBRE 2014	INDICADOR_5.-plan_de_capacitación_denver_II_pdf.pdf	08/10/2014
77	Informe técnico	informe_técnico_denver_II.pdf	12/08/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
78	Informe Técnico de la Ejecución del Plan Piloto (Diciembre 2014)	MSP-DND-2014-0528-M_- _Informe_Técnico_de_la_Ejecución_del_Plan_Piloto.pdf	10/01/2015
79	Matriz de equipamiento, fichas técnicas para rehabilitación, terapia de lenguaje, estimulación temprana; instrumento para funcionamiento e implementación de los servicios de rehabilitación	Fichas_tecnicas_tipo_B-C-_rehabilitación- terapia_de_lenguaje-estimulación_temprana-avd.xlsx	05/04/2013
80	MEMORANDO 1	INDICADOR_1.-memo_0650.pdf	08/10/2014
81	MEMORANDO 1 DE MATRIZ	INDICADOR_1.- consolidado_de_actas_setedis_msp_final-2- MEMO_650.xls	08/10/2014
82	MEMORANDO 2	INDICADOR_1.-MEMO_0657.pdf	08/10/2014
83	MEMORANDO 2 DE LA MATRIZ	INDICADOR_1.- _CONSOLIDADO_DE_ACTAS_SETEDIS_MSP_final._MEMO_657.xls	08/10/2014
84	Observaciones al Instructivo de Contratación de Cirugías Oftalmológicas	Resp._Observaciones_Instructivo_MSP- SNPSS-2015-2275.pdf	09/11/2015
85	Obtención de fondos para financiamiento de los Centros de Rehabilitación Integral.	TRANSFERENCIA_A_CRI_Y_ALBERGUES-1.pdf	05/07/2013
86	PRIORIDAD PROYECTO ATENCION INTEGRAL E INTEGRADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PRIORIDAD_PROYECTO.rar	10/02/2014
87	Proceso de adjudicación para la adjudicación de los centros de rehabilitación.	INDICADOR_5.- _CENTROS_DE_REHABILITACION_CEPRONDI.pdf	13/10/2013
88	Producción a junio del 2014	Matriz_Producción_junio_2014.xlsx	22/07/2014
89	Producción de Calificación	Producción_Calificación_Marzo_2014.xlsx	15/04/2014
90	Producción de calificación Julio 2014	produccion_julio_12-08-2014-150647-1.pdf	12/08/2014
91	Producción Proceso de Calificación Ago_2014	Producción_Calificación_Ago_2014.pdf	05/09/2014
92	Producción_Calificación_Sep_2014	Producción_Calificación_Sep_2014.pdf	07/10/2014
93	Resumen Estado de Procesos de Adquisición de Ayudas Técnicas al 06-11-2015	Resumen_Estado_de_Procesos_de_Adquisición_de_Ayudas_Técnicas_al_06-11-2015.xls	06/11/2015
94	Resumen Estado de Procesos de Adquisición de Osteosíntesis y Endoprótesis al 06-11-2015	Resumen_Estado_de_Procesos_de_Adquisición_de_Osteosíntesis_y_Endoprótesis_al_06-11-2015.xls	06/11/2015
95	Servicio de rehabilitación integral / Sep/2014	Fwd_Producción_Centros_de_Rehabilitación_Integral_de_Coordinación_06-11-2014	06/11/2014
96	Solicitud de Pago	MSP-PAIDRCS-2014-0597-M.pdf	12/08/2014
97	Taller	Segunda_Convocatoria_FSJJ.pdf	12/08/2014
98	Tamizaje neonatal	INDICADOR_7.4_TAMIZAJE_NEONATAL.pdf	15/04/2014
99	Transferencia a cinco provincias para repotencializar los centros de rehabilitación.	TRANSFERENCIA_SERVICIOS_DE_REHABILITACION.pdf	05/08/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Castañeda, Xavier	Coordinador Prevención Primaria	Coordinador Prevención Terciaria	xavier.mayorga@msp.gob.ec	
Guerra, Carlos	Coordinación Prevención Terciaria	Coordinación Prevención Terciaria	carlos.guerra@msp.gob.ec	
Jaramillo Sarmiento, Alvaro Antonio	Lider del Proyecto		alvaro.jaramillo@msp.gob.ec	
Robayo, Paulina	Monitor	Monitor	silvana.robayo@msp.gob.ec	
Román, Maritza	Coordinación de Cuidados Permanentes	Coordinación de Cuidados Permanentes	maritza.roman@msp.gob.ec	
